

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ВОЛОВСКИЙ РАЙОН**

ул. Ленина, 48, п. Волово,  
Тульская область, 301570  
факс (48768) 2-17-57, тел. 2-11-44  
E-mail: ased\_mo\_volovo@tularegion.ru

*13.04.2020 № 01-33/2197*

На № \_\_\_\_\_


**Министру  
экономического развития  
Тульской области**

**М.М. Кептэнарь**

**Уважаемый Марчел Максимович!**

В соответствии с п. 5.2 инвестиционного соглашения, заключенного между министерством экономического развития и муниципальным образованием Воловский район, о порядке реализации и совместного финансирования муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод», договором о предоставлении субсидии, направляем Вам отчет о ходе реализации инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств инвестиционного фонда Тульской области, за 1 квартал 2020 года по форме, утвержденной приказом министерства экономического развития Тульской области от 05.02.2014 №5.

**Глава администрации  
муниципального образования  
Воловский район**

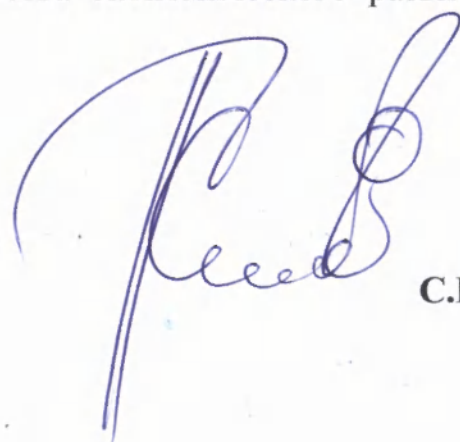

**С.Ю. Пиший**

**Отчет о предоставлении бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Тульской области для реализации муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод» за I квартал 2020 года**

**1. Месторасположение реализуемого муниципального инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств инвестиционного фонда Тульской области (далее - проект):**

1.1. Наименование муниципального района (городского округа) Тульской области: Воловский район.

1.2. Глава администрации муниципального района (городского округа) Тульской области: Пиший Сергей Юрьевич

1.3. Контактное лицо, координирующее проект, его координаты: Пиший Сергей Юрьевич, тел. 8(48768)2-11-44, Sergey.Pishiy@tularegion.ru

**2. Общие сведения об организации-инвесторе проекта:**

2.1. Полное наименование организации-инвестора проекта и его специализация: ООО «Воловский комбикормовый завод» – комплекс по производству кормов.

2.2. Местонахождение организации - инвестора проекта (юридический и фактический адрес): Россия, 301570, Тульская область, поселок Волово, в 260 м на запад от д.16 по ул. Западная кадастровый номер земельного участка 71:06:000000:1235.

2.3. Должность, Ф.И.О. руководителя организации - инвестора проекта: Генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод» Сергеев Сергей Васильевич.

**3. Сведения о ходе реализации проекта:**

3.1. Наименование и статус проекта: муниципальный инвестиционный проект «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод».

3.2. Цель проекта: строительство производственных мощностей предприятия ООО «Воловский комбикормовый завод» и строительство сети внешнего электроснабжения.

3.3. Форма реализации проекта: новое строительство.


3.4. Количество фактически созданных на отчетную дату новых рабочих мест с начала реализации проекта, в т.ч. высокопроизводительных: 21



### 3.5. Поквартальный отчет о ходе реализации Проекта:

Период реализации проекта	Мероприятие / работа	Плановый объем выполнения работ (в соответствии с паспортом проекта и инвестиционным соглашением)				Фактический объем выполнения работ				Отклонение от планового объема выполнения работ				Причины отклонения
		в натуральных показателях	в стоимостном выражении (тыс. руб. с НДС), в т.ч.:	средства Инвестора	средства инвест. фонда	в натуральных показателях (% от плана)	в стоимостном выражении (тыс. руб. с НДС), в т.ч.:	средства Инвестора	средства инвест. фонда	в натуральных показателях (% от плана)	в стоимостном выражении (тыс. руб. с НДС), в т.ч.:	средства Инвестора	средства инвест. фонда	
2020	1 кв. Проектные работы, СМР, поставка технологического оборудования		186260,0	186260,0	0	0	180347,75	180347,75	0	0	5912,25	5912,25	0	
1 кв	Строительство внешней сети электрооборудования к комплексу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ИТОГО:		186260,0	186260,0	0	0	0	180347,75	180347,75	0	0	5912,25	5912,25	0	

Начальник отдела экономического развития,  
предпринимательства и сельского хозяйства




Н.В. Хренова

### 3.6. Поквартальный отчет о финансировании Проекта

№ № п/п	Период реализации проекта		Объем финансирования проекта, тыс. руб. с НДС											
			всего			средства Инвестора			средства инвестиционного фонда Тульской области			средства местного бюджета		
	год	квартал	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	2020	1 кв.	0	0	0	0	180347,75	5912,25	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО	0	0	0	0	180347,75	5912,25	0	0	0	0	0	0

Начальник отдела экономического развития,  
предпринимательства и сельского хозяйства



Н.В. Хренова




### 3.7. Поквартальный отчет по документации по Проекту

№ п/п	Период реализации проекта		Мероприятие / работа	Сведения о заключенных контрактах				Сведения об актах приемки- передачи работ		
	год	квартал		реквизиты контракта (дата, №)	стороны по контракту	сумма контракта, тыс. руб.	фактический объем выполнения контракта, тыс. руб.	реквизиты акта (дата, №)	сумма по акту, тыс. руб.	примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		1 кв.	Строительство внешней сети электрообеспечения к комплексу	-	-	--	-	-	-	-
2.	2020	1 кв.	СМР	№ 22/07-ККЗ/ТП 22.07.2016	ООО «Нефтегазснаб»	200 000,0	145095,60			
			СМР	Договор №140 19- СМР от 28.11.2019	ООО «Центрэлектромонтаж»		9280,60			
			СМР	Договор №38/М-19 от 23.12.2019	Мичуринскремстрой ООО		3000,0			
			Стройматериалы в рамках СМР	Договор №12-19 от 05.12.2019	Фотон ООО ИК		9275,09			
			СМР	Договор №СЭ 60-90 от 26.11.2019	ООО Энерготехпроект		11447,33			
			Пусконаладка в составе СМР	Договор №508 от 02.03.2020	ВИК ООО		689,03			
			Оборудование в рамках СМР	Договор №СТ0032924 от 06.12.2019	СТ АО		1000,00			
			Стройматериалы в рамках СМР	По счету №CR-26 от 15.01.2020 по счету №CR-115 от 14.02.2020	С ГРУПП ООО		440,10			

			Проектные работы	Договор №464 от 04.12.2019	Проектная контора ГАУ ТО		120,0			
			ИТОГО:			200 000,0	180347,75			

Начальник отдела экономического развития,  
предпринимательства и сельского хозяйства



Н.В. Хренова
