

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ВОЛОВСКИЙ РАЙОН

ул. Ленина, 48, п. Волово,  
Тульская область, 301570  
факс (48768) 2-17-57, тел. 2-11-11  
E-mail: ased\_mo\_volovo@tularegion.ru

14.01.2020 № 01-33/202

На № \_\_\_\_\_


Министру  
экономического развития  
Тульской области

М.М. Кенгнаръ

Уважаемый Марчел Максимович!

В соответствии с п. 5.2 инвестиционного соглашения, заключенного между министерством экономического развития и муниципальным образованием Воловский район, о порядке реализации и совместного финансирования муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод», договором о предоставлении субсидии, направляем Вам отчет о ходе реализации инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств инвестиционного фонда Тульской области, за 4 квартал 2019 года по форме, утвержденной приказом министерства экономического развития Тульской области от 05.02.2014 №5.

Глава администрации  
муниципального образования  
Воловский район

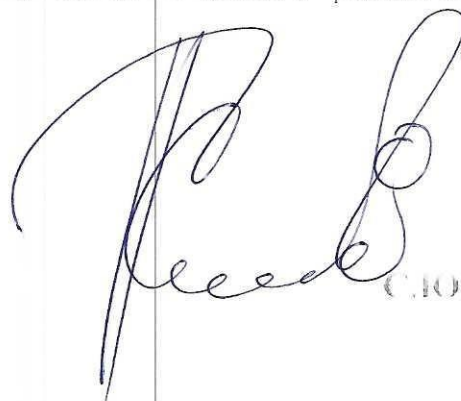

С.Ю. Пашин

**Отчет о предоставлении бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Тульской области для реализации муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод» за IV квартал 2019 года**

**1. Месторасположение реализуемого муниципального инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств инвестиционного фонда Тульской области (далее - проект):**

1.1. Наименование муниципального района (городского округа) Тульской области: Воловский район.

1.2. Глава администрации муниципального района (городского округа) Тульской области: Пилиш Сергей Юрьевич

1.3. Контактное лицо, координирующее проект, его координаты: Пилиш Сергей Юрьевич, тел. 8(48768)2-11-44, [Sergey.Pishiy@tularegion.ru](mailto:Sergey.Pishiy@tularegion.ru)

**2. Общие сведения об организации-инвесторе проекта:**

2.1. Полное наименование организации-инвестора проекта и его специализация: ООО «Воловский комбикормовый завод» - комплекс по производству кормов.

2.2. Местонахождение организации - инвестора проекта (юридический и фактический адрес): Россия, 301570, Тульская область, поселок Волово, в 260 м на запад от д.16 по ул. Западная кадастровый номер земельного участка 71:06:000000:1235.

2.3. Должность, Ф.И.О. руководителя организации - инвестора проекта: Генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод» Вохитов А.А.

**3. Сведения о ходе реализации проекта:**

3.1. Наименование и статус проекта: муниципальный инвестиционный проект «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод».

3.2. Цель проекта: строительство производственных мощностей предприятия ООО «Воловский комбикормовый завод» и строительство сети внешнего электроснабжения.

3.3. Форма реализации проекта: новое строительство.

3.4. Количество фактически созданных на отчетную дату новых рабочих мест с начала реализации проекта, в т.ч. высокопроизводительных: 21

### 3.5. Поквартальный отчет о ходе реализации Проекта:

№ п / п	Период реализации проекта		Мероприятие / работа	Плановый объем выполнения работ (в соответствии с паспортом проекта и инвестиционным соглашением)					Фактический объем выполнения работ					Отклонение от планового объема выполнения работ					Причины отклонения		
	год	квартал		в натуральных показателях	в стоимостном выражении (тыс. руб. с НДС), в т.ч.:				в натуральных показателях (% от плана)	в стоимостном выражении (тыс. руб. с НДС), в т.ч.:				в натуральных показателях (% от плана)	в стоимостном выражении (тыс. руб. с НДС), в т.ч.:						
					всего	средства Инвестора	средства инвест. фонда	средства местного бюджета		всего	средства Инвестора	средства инвест. фонда	средства местного бюджета		всего	средства Инвестора	средства инвест. фонда	средства местного бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	2019	1 кв.	Проектные работы, СМР, поставка технологического оборудования	0			0	0	0	93656,48	93656,48	0	0	0			0	0			
		2 кв.	Проектные работы, СМР, поставка технологического оборудования	0		0		0	0	97540,11	97540,11	0	0	0				0	0		
		3 кв.	Проектные работы, СМР	0		0		0	0	0	105768,34	105768,34	0	0	0				0	0	
		4 кв.	Проектные работы, СМР	0		0		0	0	0	67641,9	67641,9	0	0	0				0	0	
			ИТОГО:		401210,0	401210,0	0	0	97,1	364606,84	364606,84	0	0	2,9	-36593,36	36593,36	0	0			

Пача, начальник отдела экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства

*Зубов*

И.З. Хренова

### 3.6. Поквартальный отчет о финансировании Проекта

№ № п.п.	Период реализации проекта		Объем финансирования проекта, тыс. руб. с НДС											
			всего			средства Инвестора			средства инвестиционного фонда Гульской области			средства местного бюджета		
	год	квартал	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1 кв.	0	0	0	0	13579,11	387630,89	0	0	0	0	0	0
		2 кв.	0	0	0	0	142844,72	244786,17						
		3 кв.	0	0	0	0	105768,34	139017,83						
		4 кв.	0	0	0	0	67641,90	36593,36	0	0	0	0	0	0
	2019	Итого	401210,0	364606,84	36593,36	401210,0	364606,84	36593,36	0	0	0	0	0	0

Начальник отдела экономического развития,  
предпринимательства и сельского хозяйства



Н.В. Хренова



### 3.7. Поквартальный отчет по документации по Проекту

№ п/п	Период реализации проекта		Мероприятие / работа	Сведения о заключенных контрактах				Сведения об актах приемки-передачи работ		
	год	квартал		реквизиты контракта (дата, №)	стороны по контракту	сумма контракта, тыс. руб.	фактический объем выполненных контракта, тыс. руб.	реквизиты акта (дата, №)	сумма по акту, тыс. руб.	примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2019	1 кв.	СМР	№ 22-07-КК 3111 22.07.2016	ООО «Нефтегазснаб»	200 000,0	97 540,28	-	-	-
2.		2 кв.	СМР	№ 22-07-КК 3111 22.07.2016	ООО «Нефтегазснаб»	200 000,0	97 540,11	-	-	-
3.		3 кв.	СМР СМР Монтажные и пуско-наладочные работы	№ 22-07-КК 3111 22.07.2019 № 22-07-М 0144 22.07.2019 Договор № 000-000-000 от 04.09.19	ООО «Нефтегазснаб» ООО «Нефтегазснаб» «Петротехпроект» ООО	200 000,00 200 000,00 37 900,00	83 592,25 127 639,6 200 000,0	-	-	-
4.		4 кв.	СМР	№ 22-07-КК 3111 22.07.2016	ООО «Нефтегазснаб»	200 000,0	149 560,78	-	-	-
			СМР	№ 22-07-КК 3111 22.07.2016	ООО «Нефтегазснаб»	200 000,0	239 655	-	-	-
			СМР	Договор № 140-19-СМР от 28.11.2019	ООО «Электромонтаж»	-	232 740	-	-	-
			СМР	Договор № 000-000-000 от 26.11.2019	ООО «Энергоснабжение»	-	290 340	-	-	-
			Оборудование в рамках СМР	Договор № 12-19 от 05.12.2019	Фонд ООО «НК»	-	200 000	-	-	-
			Оборудование в рамках СМР	Договор № 010032024 от 06.12.2019	ООО «АГ»	-	40 640,78	-	-	-

		Оборудование в рамках СМР	Договор №03-10/2019 КМ от 03.10.2019	И.Зиминский (д.т.с. 0000)	358,20	
		Прочие проектные, монтажные и пуско- наладочные работы в инвест. период			8600,45	
		Итого 4 кв.			67 641,90	
		<b>ИТОГО:</b>			364606,84	

Начальник отдела экономического развития,  
предпринимательства и сельского хозяйства



Н.В. Хренова
